

十一月七日は立冬で、こよみの上では冬になりました。今年の山形は、少しだけ季節の進行が遅い気がします。まだ、冬というにはちょっと早い感じの『晩秋』です。ただ、そろそろ天気予報に雪だるまのマークが登場するようになり、冬に対する備えだけは済ませておこうと思います。遠くに見える山々も、色とりどりに染まりました。今年の役目を終えた田んぼは、静かに冬の訪れを待っています。

山形市学校給食センター整備運営事業

下河原かわら版


第六号

発行：2008年（平成20年）11月

山形建設・鹿島道路共同企業体
（山形市学校給食センター新築工事現場）

山形市大字沼木字下河原1139-19

☎(023)647-7425

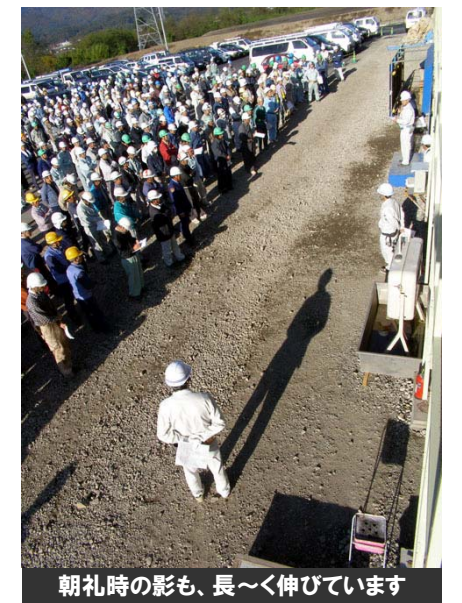

朝礼時の影も、長〜く伸びています

工事の進捗について

工事は順調に進んでいます。

建物の外側の工事は、八割がた出来上がりました。屋根工事は十月中旬に完了しました。外壁工事は、A棟・B棟のそれぞれ東西の壁面が完了しました。正面入口・トラックの搬入口がある北側と、搬出口がある南側の外壁面は、東西面とは種類やデザインが異なるためにもうしばらくかかります。

東西面の外壁工事が完了したことに伴い、建物を覆うように組み立てられていた足場が解体され、きれいなクリーム色の壁面が見えるようになりました。東北中央道を通られた方は、ご覧になられたことと思います。



◀ A棟西面



◀ B棟東面



◀ A棟・B棟の間

さて、内部の工事はだいぶ混雑しています。間仕切り壁を立てる工事、天井を貼り付ける工事、部屋の扉や窓枠を取り付ける工事、空調用のダクトの取り付けや配管の工事、照明機器の取り付けや配線の工事など数多くの工種、工事が並行して行われております

先月のかわら版でもご紹介した内部足場は、工事が完了した部分は解体し、また別の場所に組み立てて、工事の足場を確保しています。




B棟内部の洗浄室。足場が見えます



A棟、足場の上での作業の様子です



A棟、天井高さ6.3mの洗浄室です

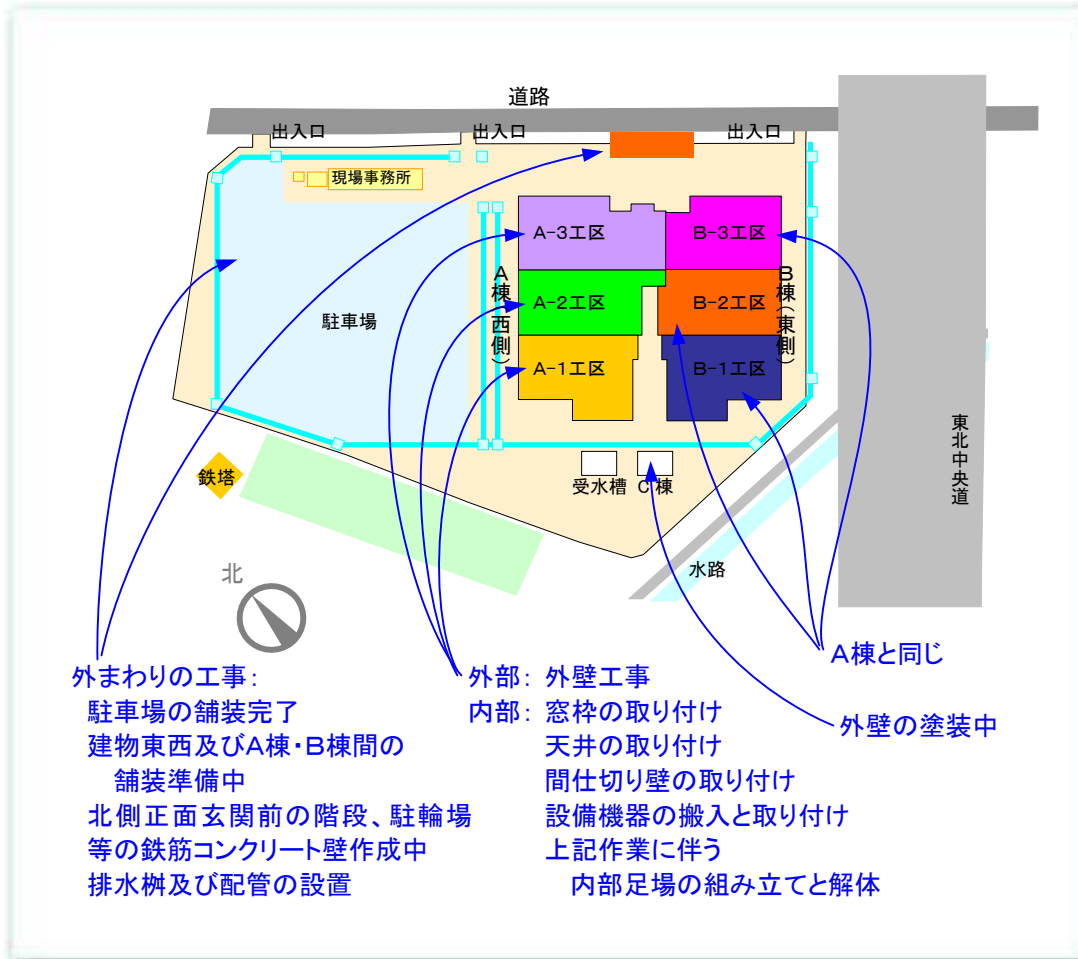

現場視察

山形市議会・産業文教委員会

十一月十二日(水)、山形市議会の産業文教委員会のみなさんが、現場の視察にいらっしやいました。

現場事務所の会議室で、工事の概要や進み具合などについて説明を行い、その後現場を巡回しました。

委員の皆さんは、安全面での問題はないか、工事が予定通り進んでいるかなどについて確認なされていました。

現場視察の様子です



飯塚の歴史散歩

飯塚小学校跡

～ 県女子師範附属、村立、市立となった校舎跡 ～

現在の山形市学校給食センターは、飯塚町にあります。これまで約四十年間、山形市の小中学校に給食を提供しつづけてきました。

案内板にあるように、給食センターのある場所には以前は飯塚小学校がありました。飯塚小学校は十小に統廃合され、飯塚小学校の校舎も姿を消しました。

ちなみに、同じ飯塚町に新たに誕生した市立宮浦小学校は、昭和五十六年の創立です。



旧飯塚小学校
飯塚町郷土史研究会発行
「ふるさと飯塚の史跡」
パンフレットより



おなじみのピンクのトラック



女子師範附属小(大正十三、昭和七)、昭和三年高等科設置、国民学校を経て市立飯塚小へ。昭和三十九年、飯塚小を廃止して第十小へ統合。校舎は「十小飯塚校舎」となり、四十一年解体。学校給食センター用地となった。

※案内板のごとく

飯塚小学校は明治六年(一八七三)、楊柳寺を借り受けて創設。同十三年、日森岡(現稲荷神社境内)の村有初倉に移転。二十一年になって同地に新築の校舎が完成した。大正十年の大火により消失すると楊柳寺と高橋基三郎家の養蚕小舎を仮校舎に移転。十二年十二月末日、五間×二十三間木造二階建ての新校舎が当地に落成した。



長年親しまれてきたバス停

地球環境にやさしく

ゴミの分別 行っています

当現場は、資材の残りや梱包材などから出た要らない物を再利用しやすくするために、分別して処理しています。

現場で発生する不要物は、金属類、石こうボード、木材、段ボールなどに分けて処分しています。

現場事務所のゴミも、一般家庭と同様の分類で分別し、専門業者による収集を行っています。

当現場では、できるだけ残材が出ないような配慮も行っており、地球環境の保全に気を配っています。



現場内の何ヶ所かにあります



事務系のゴミはこちらで分別



自販機の前はあき缶・ペットボトル



金属類



石こうボード類

足場から見た 交差点工事

中部三号線道路改良工事

道路は十月下旬に舗装が行われ、当現場前の道路と無事つながりました。今後の開通に向け、細かな整備と調整が行われているところです。



開通する日が
楽しみですわ

整備終了!

現場のご近所


道路をはさんだ当現場の向い側には、山形市の用地があります。

私達が工事をはじめてしばらくは草が伸び伸び育つ緑色の土地でしたが、九月から十月にかけて造成工事が行われました。

現在は、見違えるようにきれいに整えられました。



8月下旬の頃の様子



整備終わりました。11月
